



CLUB DEPORTIVO BASICO GUAYAQUIL COUNTRY CLUB

MANTENIMIENTO CAMPO DE GOLF

REPORTE SEMANAL

Semana (lunes-viernes) Fecha: 06 al 10 de julio

Contenido

1. Corte de las áreas del campo de golf.....	2
1.1 Corte de Green.....	2
1.2 Corte de Tees.....	2
1.3 Corte de fairways y antegreens.....	2
1.4 Corte de rough.....	2
2.Topdressing.....	3
3.Fertilización.....	3
4. Control de malezas en el campo.....	4
5. Limpieza y mantenimiento.....	5
6. Reparaciones hidráulicas (riego).....	9
7. Monitoreo y registro del campo.....	10
7.1 Información meteorológica	10
7.2 Medición de humedad.....	11
8. Áreas adicionales.....	12
9. Checklist de compras semanales.....	13
10. Checklist actividades para la próxima semana.....	14



1. Corte de las áreas del campo de golf

1.1 Corte de Greens

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 06, 07, 08, 09 y 10 de julio
- ☐ Altura: 3.30 mm.

1.2 Corte de Tees

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 06, 08 y 10 de julio
- ☐ Altura: 12 mm.

1.3 Corte de Fairways y antegreens

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 06, 07, 08, 09 y 10 de julio
- ☐ Altura: 12 mm.

1.4 Corte de roughs

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 06, 07, 08, 09 y 10 de julio
- ☐ Altura: 2 pulgadas.



2. Top dressing



Actividad: Top dressing en campo de práctica

Duración: 06 de julio



Actividad: Top dressing en campo de práctica (nivelación de zona donde se sacaron champas para resembrar)

Duración: 06, 07 y 08 de julio



3. Fertilización



Actividad: Fertilización en greens
Duración: 08 y 09 de julio



Actividad: Fertilización en tees, fairways y roughs
Duración: 08 y 09 de julio

4. Control de maleza en el campo



Actividad: Control maleza con mochila en tee de práctica
Duración: 06 de julio



Actividad: Control maleza con mochila localizado (primera vuelta)
Duración: 06, 07, 08, 09 y 10 de julio



Actividad: Control maleza en campo
Duración: 06 y 07 de julio

5. Limpieza y mantenimiento campo de golf



Actividad: Trabajo de enrocado en el lago 2 y 6
Duración: 06, 07, 08, 09 y 10 de julio




Actividad: Limpieza de aspersores
Duración: 06, 07 y 08 de julio



Actividad: Grooming en greens
Duración: 06 de julio



Actividad: Ampliación de tees (hoyo 1 al 8)
Duración: 06 de julio



Actividad: Desmalezamiento en hoyo 8, 10
Duración: 07, 08, 09 y 10 de julio



Actividad: Aplicación de yeso agrícola en greens y antegreens
Duración: 06 y 07 de julio



Actividad: Aplicación de yeso agrícola en tees, fairways y roughs
Duración: 06 y 07 de julio



Actividad: Sopladora alrededor de greens
Duración: 06, 07, 08, 09 y 10 de julio



Actividad: Mantenimiento en bunkers
Duración: 06, 07, 08, 09 y 10 de julio



Actividad: Traslado de piedras a los hoyos (tees)
Duración: 08 de julio



Actividad: Instalación de tótems (placas) en los hoyos (tees)
Duración: 09 y 10 de julio



Actividad: Nivelación con arena en tees
Duración: 09 y 10 de julio



Actividad: Nivelación de bordillo carpath hoyo 18
Duración: 09 y 10 de julio



Actividad: Aplicación de herbicida para mejorar visibilidad en hoyo 5
Duración: 09 de julio



Actividad: Fertilización en vivero hoyo 5
Duración: 09 de julio



Actividad: Poda de árboles
Duración: 07 de julio



Actividad: Aplicación de algas marinas en el campo
Duración: 09 y 10 de julio



Actividad: Recogida de peces muertos en los lagos
Duración: 07, 09 y 10 de julio



Actividad: Tala de árboles secos en hoyo 1-7
Duración: 10 de julio



Actividad: Aplicación de fungicida (control preventivo) en greens
Duración: 10 de julio



Actividad: Turbina en campo
Duración: 10 de julio

6. Reparaciones hidráulicas (riego)



Actividad: Reemplazo de codificadores en hoyo 3 y 6
Duración: 06 de julio



Actividad: Reemplazo de retenedores en hoyo 8, 11 y 14
Duración: 06, 07 y 08 de julio



Actividad: Reemplazo de caucho de silleta en hoyo 10
Duración: 07 de julio



Actividad: Reemplazo de llave en aspersor hoyo 11
Duración: 10 de julio




Actividad: Arreglo hidráulico rough hoyo 1
Duración: 10 de julio




7. Monitoreo y registro del campo

7.1 Medición de humedad

FECHA: 09/07/2026

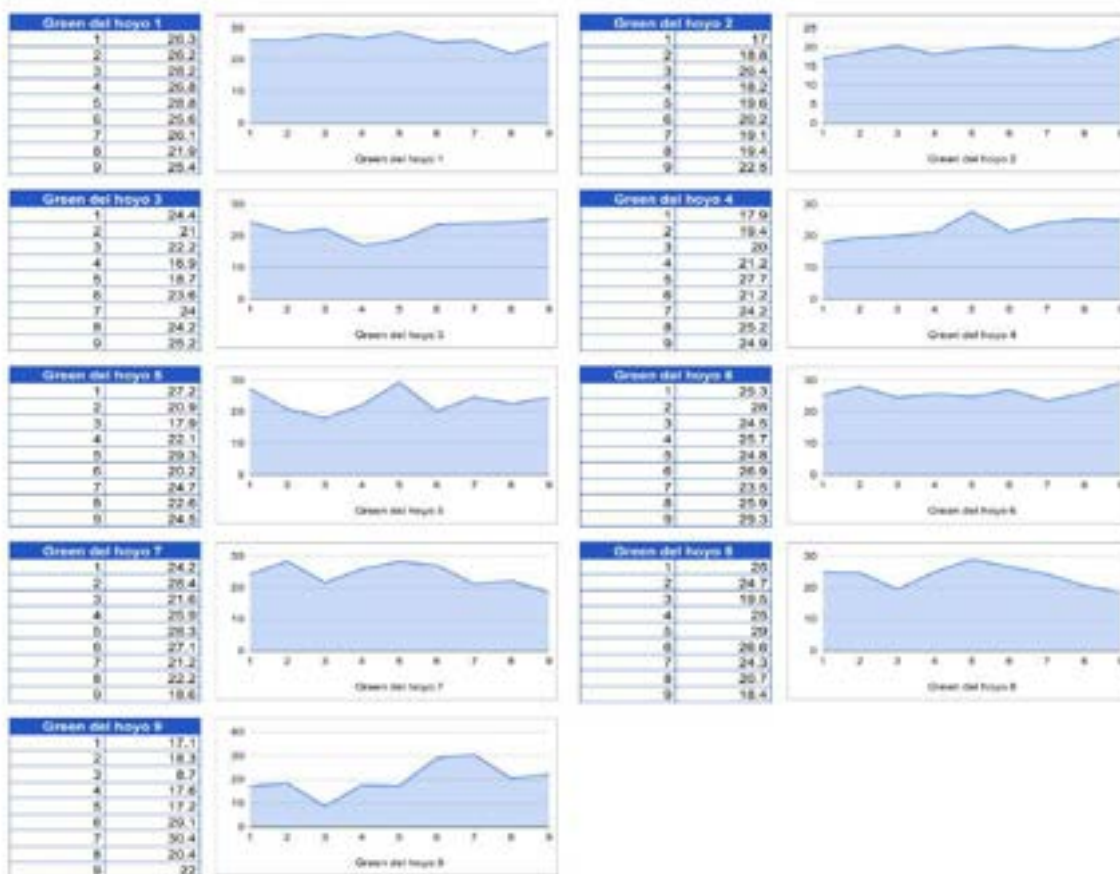

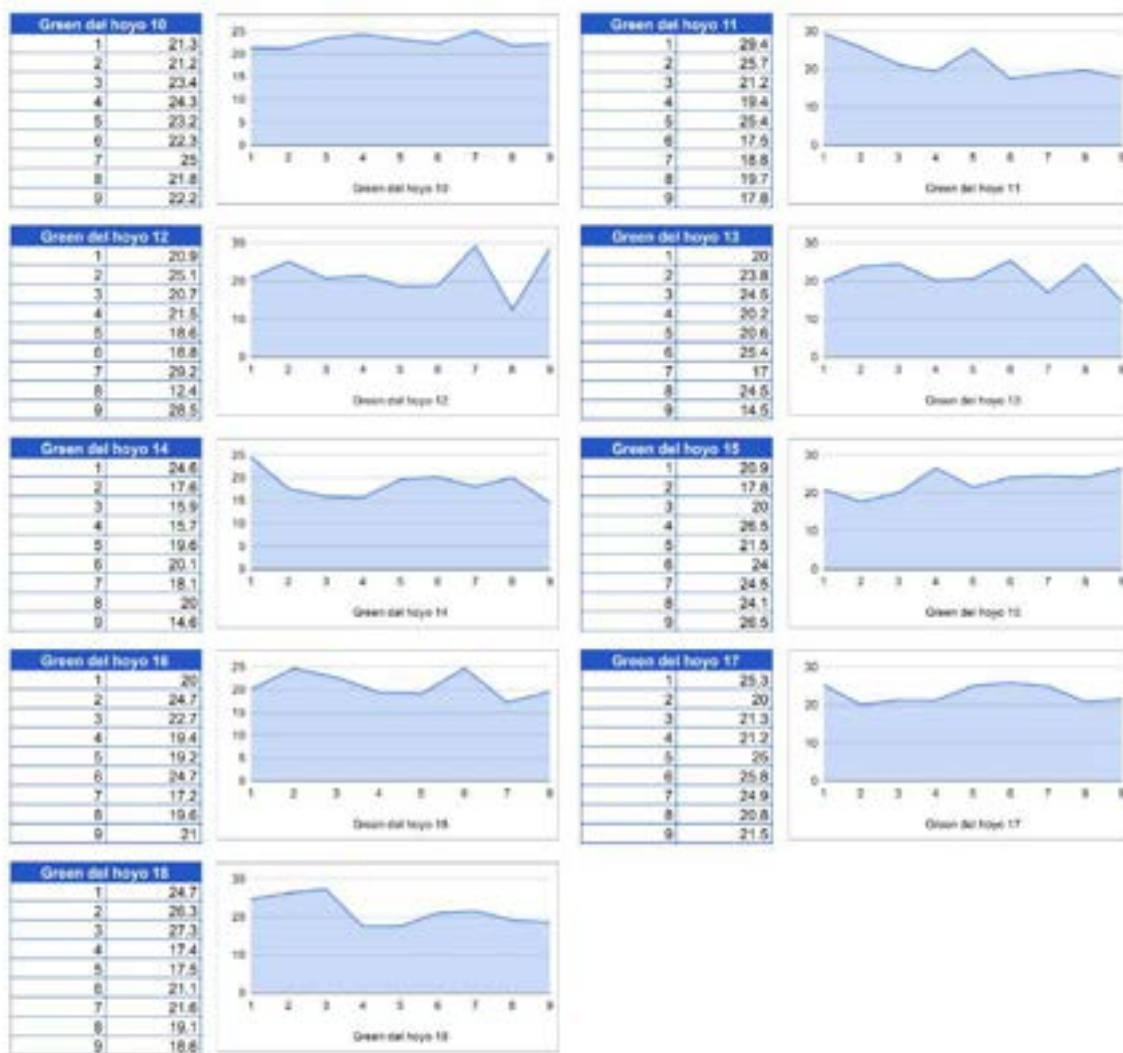



8. Áreas adicionales



Actividad: Mantenimiento en cancha de fútbol

Duración: 06, 07 y 10 de julio



Actividad: Mantenimiento en prado (corte)

Duración: 10 de julio



Actividad: Mantenimiento en garita principal

Duración: 06, 07, 08, 09, 10 de julio



Actividad: Mantenimiento en área de Hípica

Duración: 10 de julio



9. Checklist de compras semanales

Nº	DESCRIPCIÓN		P	EP	OK	OBSERVACIÓN
1	MEDIDOR DE PH BOLSILLO	AGROINSUMO		X		En espera de despacho
2	FUMIGADOR JACTO 600L	CAMPO DE GOLF	X			En espera de aprobación
3	ARENA PALENQUE 6 VIAJES			X		En espera de despacho

Nº	DESCRIPCIÓN		P	EP	OK	OBSERVACIÓN
1	REPUESTO	GREENSMaster 3150		X		En espera de despacho
2	REPUESTOS	GROUNDMASTER 3500D - REEL MASTER 5510/5610		X		En espera de despacho
3	MOTOR	SAND PRO 5040		X		En espera de despacho
4	REPUESTO / TINES	PROCORE 648		X		En espera de despacho

10. Checklist actividades para la próxima semana

TRABAJO DE RUTINA, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CAMPO DE GOLF							
Tercera semana de Julio	L	M	M	J	V	S	D
	13	14	15	16	17	18	19
GREENS:							
CORTE DE GREENS							
CEPILLO							
GROOMING							
VERTICUT							
AIREACION CON TINES SOLIDOS							
ARENAR GREENES ZONIFICADO							
PASAR MALLA							



RODILLO							
RECOGER SOBRANTE DE LA AIREACION							
FERTILIZACION FOLIAR							
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA							
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)							
CONTROL INTEGRADO DE HONGOS PREVENTIVO							
CAMBIO DE HOYOS							
TAMIZAR ARENA							
CONTAMINACION HOYO 11							
MEZCLAR ARENA CON FUNGICIDA EN POLVO							
VELOCIDAD 9.5							
MEDICION DE HUMEDAD							
RIEGO NOCTURNO							
ANTE GREENS:							
CORTE							
VERTICUT PARA AMPLIACION DE GREENS							
AIREACION CON TINES SOLIDOS							
PASAR MALLA							
ARENAR ANTEGREENES							
LIMPIEZA DE ASPERSORES							
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA							
RECOGER SOBRANTE DE LA AIREACION							
FERTILIZACION							
CONTROL MALEZA							
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)							



CONTROL DE HONGOS				Yellow			
ARREGLO EN ZONAS ESCALPADAS SEGUNDA VUELTA							
RIEGO NOCTURNO	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
TEES:							
CORTE	Blue		Blue		Blue		
VERTICUT							
RECOGER SOBRANTE DEL VERTICUT							
AIREACION							
RECOGER NUCLEOS							
TURBINA				Purple	Purple		
FERTILIZACION			Green	Green			
LIMPIEZA DE ASPERSORES	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue		
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS							
CONTROL DE MALEZA	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink		
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA							
RIEGO NOCTURNO	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FAIRWAYS:							
CORTE	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue		
VERTICUT							
FERTILIZACION			Green	Green			
FERTILIZAR VIVERO HOYO 5							
ARREGLO SUMIDERO HOYO 11	Green	Green	Green	Green	Green		
CONTROL DE MALEZA	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink		
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)	Yellow						
AIREACION ZONIFICADO							



PASAR MALLA PARA DESVANECER LOS NUCLEO DE LA AIREACION							
TURBINA							
LIMPIEZA DE ASPERSORES							
RECOGER SOBRANTE DEL VERTICUT							
CONSTRUIR DRENAJE EN HOYO 15							
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA							
RIEGO NOCTURNO							
LAGUNAS							
BORDEO GUADAÑA Y MACHETE							
ENROCADO LAGO HOYO 6							
APLICAR ACEITE QUEMADO EN HOYO 2, 5, 8, 12 Y 15							
BUNKERS:							
RASTRILLO/REMOVER ARENA							
REVISAR CAPAS DE ARENA							
CORTE TALUD BUNKERS							
ROUGHs:							
CORTE							
VERTICUT EN ZONAS DONDE SE AMPLIARAN LOS TEES							
TOPDRESSING ZONA ESCALPADA HOYO 6							
FERTILIZACION							
TURBINA							
APLICAR FERTILIZANTE EDAFICO EN PELADEROS							
REALIZAR PRUEBA CON TAPETE "GRAMOQUIN"							
DESMALEZAR MANUAL HOYO 11 y 15							
LIMPIEZA DE ASPERSORES							



AIREACION EN ZONA DONDE ESTA PERMEABLE							
QUITAR ARBOLES SECOS HOYO 13							
RECOGER SOBRANTE DEL VERTICUT/ AIREACION							
CONTROL DE MALEZA							
PASAR MALLA PARA DESVANECER LOS NUCLEO DE LA AIREACION							
PASAR ROTOVITO EN TRAFICO DE CARRITOS DE GOLF							
NIVELACION DE ZONA HUNDIDA EN EL HOYO 1 y 7							
DEFINIR ORILLOS DONDE HAY PIEDRA CHISPA EN EL CAMPO							
RESIEMBRA CON NUCLEOS DE LA AIREACION							
RIEGO NOCTURNO							
CAMPO DE PRACTICA							
CORTE							
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS							
AIREACION ZONIFICADA LINEA DE DIVOTS							
FERTILIZACIÓN							
TOP DRESSING DONDE SACARON CHAMPAS							
CONTROL MALEZA EN VIVERO EN GREENS / DRIVING DRENCH							
JARDINES CAMPO GOLF							
FERTILIZACION							
FUMIGACION 18H00 - 22H00							
CONTROL MALEZA							
PODA DE ARBOLES SECOS HOYO 1, 11, 13							
CORREGIR DESNIVELES DEL SUELO CERCA DE LOS ARBOLES							
JARDINES GARITA PRINCIPAL							
FERTILIZACION							



CONTROL PLAGAS							
CONTROL MALEZA							
PODA DE ARBOLES							
RIEGO CAMPO DE GOLF							
NIVELAR ASPERSORES HUNDIDOS EN GREENS							
LIMPIEZA DE ASPERSORES TAPADOS Y CODIFICACION							
CANCHA DE FUTBOL							
CORTE							
CONTROL MALEZA							
TOPDRESSING							
FERTILIZACION							



CLUB DEPORTIVO BASICO GUAYAQUIL COUNTRY CLUB

MANTENIMIENTO CAMPO DE GOLF

REPORTE SEMANAL

Semana (lunes-viernes) Fecha: 13 al 17 de julio

Contenido

1. Corte de las áreas del campo de golf.....	2
1.1 Corte de Green.....	2
1.2 Corte de Tees.....	2
1.3 Corte de fairways y antegreens.....	2
1.4 Corte de rough.....	2
2.Topdressing.....	3
3.Fertilización.....	3
4. Control de malezas en el campo.....	4
5. Limpieza y mantenimiento.....	5
6. Reparaciones hidráulicas (riego).....	9
7. Monitoreo y registro del campo.....	10
7.1 Información meteorológica	10
7.2 Medición de humedad.....	11
8. Áreas adicionales.....	12
9. Checklist de compras semanales.....	13
10. Checklist actividades para la próxima semana.....	14



1. Corte de las áreas del campo de golf

1.1 Corte de Greens

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 13, 14, 15, 16 y 17 de julio
- ☐ Altura: 3.30 mm.

1.2 Corte de Tees

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 13, 14, 15, 16 y 17 de julio
- ☐ Altura: 12 mm.

1.3 Corte de Fairways y antegreens

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 13, 14, 15, 16 y 17 de julio
- ☐ Altura: 12 mm.

1.4 Corte de roughs

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 13, 14, 15, 16 y 17 de julio
- ☐ Altura: 2 pulgadas.



2. Top dressing



Actividad: Top dressing en campo de práctica

Duración: 13 de julio



Actividad: Nivelación de zonas donde se sacaron champas para resembrar

Duración: 16 y 17 de julio



Actividad: Top dressing en vivero campo de práctica

Duración: 14 de julio



3. Fertilización



Actividad: Fertilización en greens
Duración: 15 y 16 de julio



Actividad: Fertilización zonas escalpadas antegreens, fairways, roughs y tees.
Duración: 14 de julio



Actividad: Fertilización con boleadora en tees, fairways y roughs
Duración: 15 y 16 de julio



4. Control de maleza en el campo



Actividad: Control maleza con mochila localizado hoyos 9 hasta 15
Duración: 13, 14, 15, 16 y 17 de julio



Actividad: Control maleza con tractor (jacto) segunda vuelta
Duración: 14, 15, 16 y 17 de julio



Actividad: Control malezas en loma de práctica
Duración: 17 de julio



5. Limpieza y mantenimiento campo de golf



Actividad: Trabajo de enrocado en el lago 6 y 12
Duración: 13, 14, 15, 16 y 17 de julio



Actividad: Nivelación de aspersores en antegreens
Duración: 14, 15, 16 y 17 de julio



Actividad: Grooming en greens
Duración: 13 de julio



Actividad: Arreglo sumidero (drenaje) antegreen hoyo 11
Duración: 13, 14, 15, 16 y 17 de julio



Actividad: Desmalezamiento en hoyo 11, 12, 13, 15
Duración: 13, 14, 15, 16 y 17 de julio



Actividad: Aplicación de insecticida para grillo topo
Duración: 13 de julio



Actividad: Aplicación de algas marinas en el campo
Duración: 14 de julio



Actividad: Sopladora alrededor de greens
Duración: 13, 14, 15, 16 y 17 de julio



Actividad: Mantenimiento en bunkers
Duración: 13, 14, 15, 16 y 17 de julio



Actividad: Traslado de piedras a los hoyos e instalación de tótems faltantes (tees)
Duración: 13 de julio



Actividad: Aplicación de insecticida en greens
Duración: 13 de julio



Actividad: Desbrozadora filo de lagos, carpath
Duración: 13, 14, 15 y 16 de julio



Actividad: Poda de raíces hoyo 13
Duración: 14 de julio



Actividad: Nivelación con arena en carpath hoyo 6
Duración: 14 de julio



Actividad: Aplicación de regulador de crecimiento para control de bermuda en
hoyos 2, 9-18
Duración: 14 de julio



Actividad: Sopladora en hoyo 10 y 13
Duración: 15 y 16 de julio



Actividad: Turbina en campo
Duración: 16 y 17 de julio



Actividad: Mezcla de biocompost y arena para los divots
Duración: 16 de julio



Actividad: Roller en greens
Duración: 17 de julio

6. Reparaciones hidráulicas (riego)



Actividad: Arreglo daño hidráulico en rough hoyo 1
Duración: 13, 14 y 15 de julio



Actividad: Arreglo sista electrónico en hoyo 4
Duración: 16 de julio



Actividad: Cambio de codificador en hoyo 4
Duración: 16 de julio



Actividad: Reemplazo de cable sulfatado en hoyo 4
Duración: 16 de julio



Actividad: Arreglo hidráulico rough hoyo 1


Duración: 10 de julio


7. Monitoreo y registro del campo



7.1 Medición de humedad

FECHA: 16/07/2026

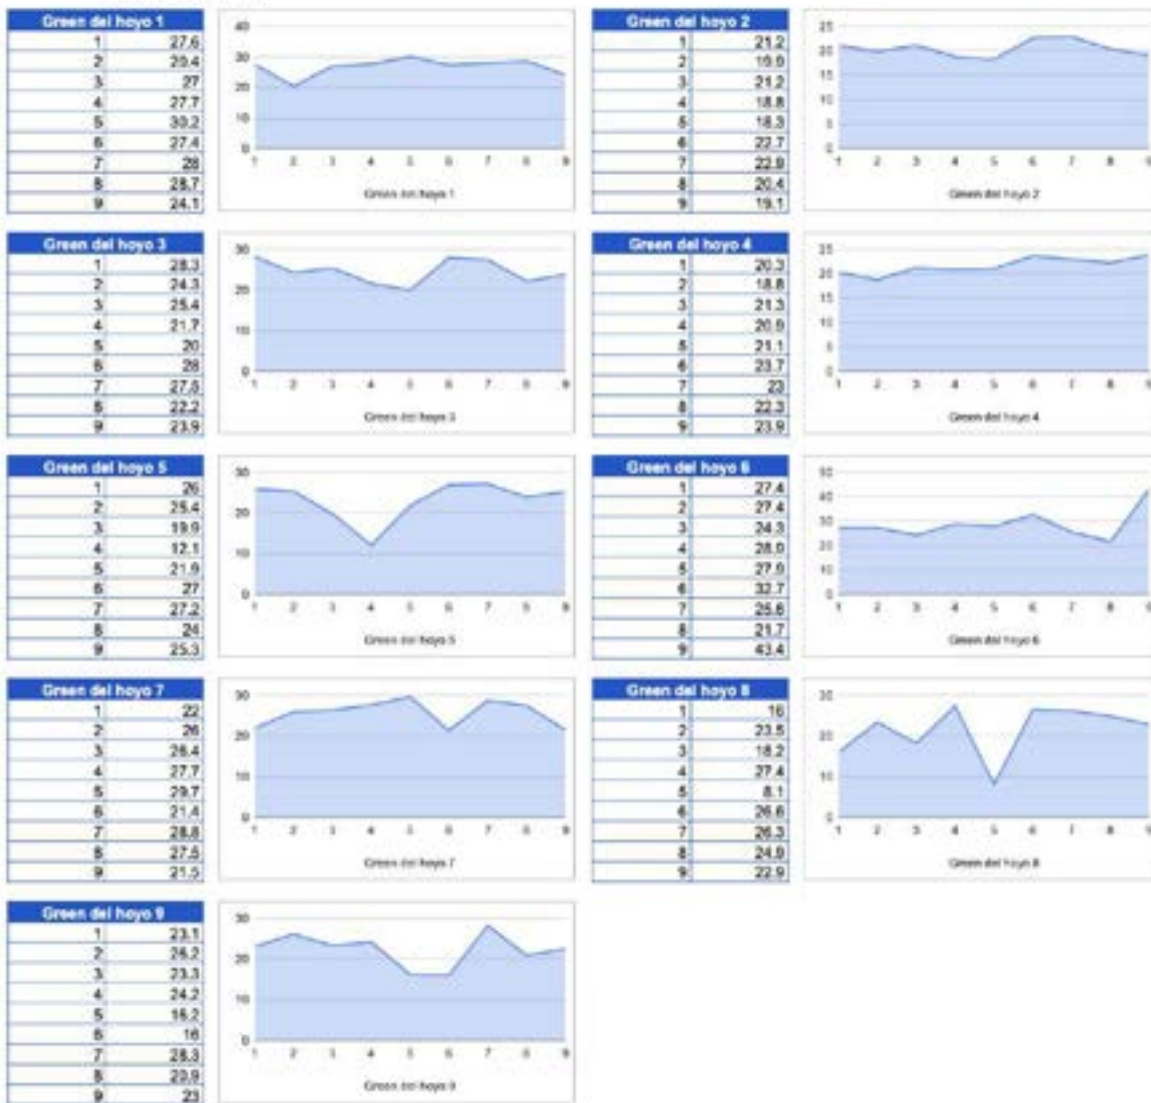

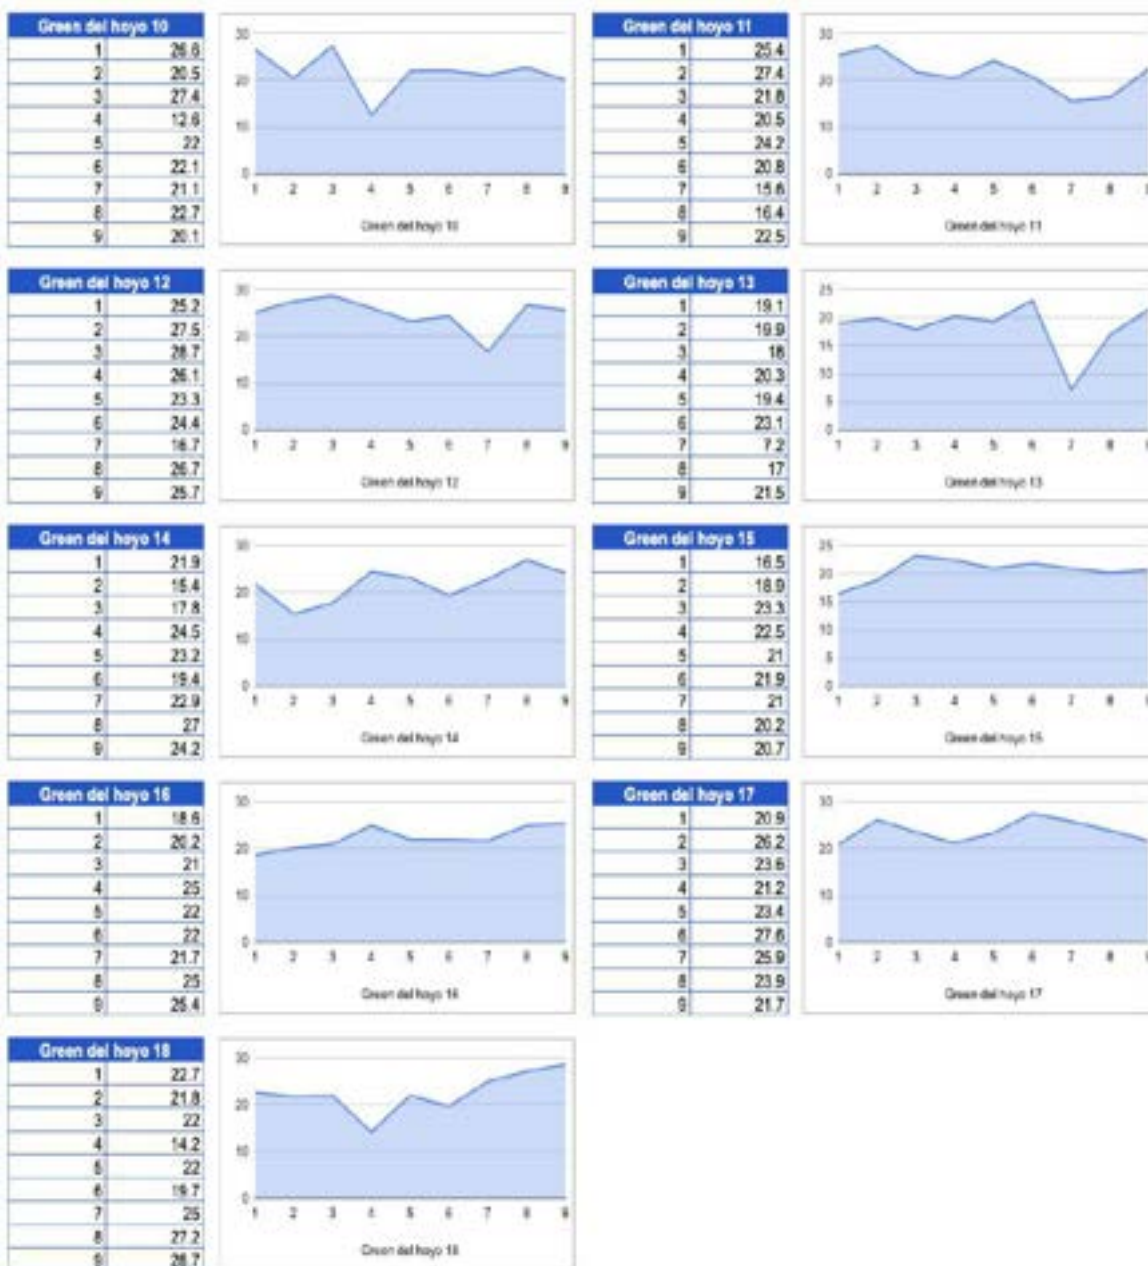



8. Áreas adicionales



Actividad: Mantenimiento en cancha de fútbol

Duración: 13, 15 y 17 de julio



Actividad: Mantenimiento en casa club

Duración: 13, 15 y 17 de julio



Actividad: Mantenimiento en cancha de tennis (fertilización)
Duración: 17 de julio



Actividad: Mantenimiento en garita principal
Duración: 06, 07, 08, 09, 10 de julio



9. Checklist de compras semanales

Nº	DESCRIPCIÓN		P	EP	OK	OBSERVACIÓN
1	MEDIDOR DE PH BOLSILLO	AGROINSUMO		X		En espera de despacho
2	FUMIGADOR JACTO 600L	CAMPO DE GOLF	X			En espera de aprobación
3	ARENA PALENQUE 6 VIAJES			X		En espera de despacho

Nº	DESCRIPCIÓN		P	EP	OK	OBSERVACIÓN
1	REPUESTO	GREENSMaster 3150		X		En espera de despacho
2	REPUESTOS	GROUNDMASTER 3500D - REEL MASTER 5510/5610		X		En espera de despacho
3	MOTOR	SAND PRO 5040		X		En espera de despacho
4	REPUESTO / TINES	PROCORE 648		X		En espera de despacho

10. Checklist actividades para la próxima semana

TRABAJO DE RUTINA, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CAMPO DE GOLF							
Cuarta semana de Julio	L	M	M	J	V	S	D
	20	21	22	23	24	25	26
GREENS:							
CORTE DE GREENS							
CEPILLO							
GROOMING							
VERTICUT							
AIREACION CON TINES SOLIDOS							
ARENAR GREENES ZONIFICADO							
PASAR MALLA							



RODILLO							
RECOGER SOBRANTE DE LA AIREACION							
FERTILIZACION FOLIAR							
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA							
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)							
CONTROL INTEGRADO DE HONGOS PREVENTIVO							
CAMBIO DE HOYOS							
TAMIZAR ARENA							
MEZCLAR ARENA CON FUNGICIDA EN POLVO							
VELOCIDAD 9.75							
MEDICION DE HUMEDAD							
RIEGO NOCTURNO							
ANTE GREENS:							
CORTE							
VERTICUT PARA AMPLIACION DE GREENS							
AIREACION CON TINES SOLIDOS							
PASAR MALLA							
ARENAR ANTEGREENES							
NIVELACION DE ASPERSORES							
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA							
RECOGER SOBRANTE DE LA AIREACION							
FERTILIZACION							
CONTROL MALEZA							
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)							
CONTROL DE HONGOS							



ARREGLO EN ZONAS ESCALPADAS SEGUNDA VUELTA							
RIEGO NOCTURNO							
TEES:							
CORTE							
AMPLIACION DEL 9 AL 18							
VERTICUT							
RECOGER SOBRANTE DEL VERTICUT							
REALIZAR MUESTRA DE JARDIN EN LOS TOTEMS							
AIREACION							
RECOGER NUCLEOS							
TURBINA							
FERTILIZACION							
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS							
CONTROL DE MALEZA							
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA							
RIEGO NOCTURNO							
FAIRWAYS:							
CORTE							
VERTICUT							
FERTILIZACION EDAFICA							
CONTROL DE MALEZA							
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)							
AIREACION ZONIFICADO							
PASAR MALLA PARA DESVANECER LOS NUCLEO DE LA AIREACION							
TURBINA							



RECOGER SOBRANTE DEL VERTICUT							
CONSTRUIR DRENAJE EN HOYO 15							
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA							
RIEGO NOCTURNO							
LAGUNAS							
BORDEO GUADAÑA Y MACHETE							
APLICAR ACEITE QUEMADO EN HOYO 2, 5, 8, 12 Y 15							
BUNKERS:							
RASTRILLO/REMOVER ARENA							
REVISAR CAPAS DE ARENA							
CORTE TALUD BUNKERS Y DELINEAR BUNKERS							
ROUGHS:							
CORTE							
VERTICUT EN ZONAS DONDE SE AMPLIARAN LOS TEES							
FERTILIZACION							
TURBINA							
APLICAR FERTILIZANTE EDAFICO EN PELADEROS (HOYO 2, 7)							
DESMALEZAR MANUAL							
AIREACION EN ZONA DONDE ESTA PERMEABLE							
QUITAR ARBOLES SECOS							
RECOGER SOBRANTE DEL VERTICUT/ AIREACION							
CONTROL DE MALEZA							
PASAR MALLA PARA DESVANECER LOS NUCLEO DE LA AIREACION							
PASAR ROTOVITO EN TRAFICO DE CARRITOS DE GOLF							
TOP DRESSING SUMIDERO HOYO 1 Y 7							



DEFINIR ORILLOS DONDE HAY PIEDRA CHISPA EN EL CAMPO	Blue	Blue	Blue	Blue			
RESIEMBRA CON NUCLEOS DE LA AIREACION							
RIEGO NOCTURNO	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
CAMPO DE PRACTICA							
CORTE	Dark Blue		Dark Blue				
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Pink	Pink	Pink	Pink			
AIREACION ZONIFICADA LINEA DE DIVOTS	Light Blue						
FERTILIZACIÓN	Green						
FERTILIZACION EDAFICA ZONAS DONDE SE SACARON CHAMPAS		Orange					
CONTROL MALEZA EN VIVERO EN GREENS / DRIVING DRENCH				Grey			
JARDINES CAMPO GOLF							
FERTILIZACION							
FUMIGACION 18H00 - 22H00							
CONTROL MALEZA	Blue	Blue	Blue	Blue			
CORREGIR DESNIVELES DEL SUELO CERCA DE LOS ARBOLES							
JARDINES GARITA PRINCIPAL							
FERTILIZACION			Dark Green	Dark Green			
CONTROL PLAGAS	Red						
CONTROL MALEZA	Pink	Pink	Pink	Pink			
PODA DE ARBOLES							
RIEGO CAMPO DE GOLF							
LIMPIEZA DE ASPERORES TAPADOS Y CODIFICACION	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow			
CANCHA DE FUTBOL							
CORTE	Brown		Brown				
CONTROL MALEZA				Blue			



TOPDRESSING							
FERTILIZACION FOLIAR							



CLUB DEPORTIVO BASICO GUAYAQUIL COUNTRY CLUB

MANTENIMIENTO CAMPO DE GOLF

REPORTE SEMANAL

Semana (lunes-viernes) Fecha: 20 al 24 de julio

Contenido

1. Corte de las áreas del campo de golf.....	2
1.1 Corte de Green.....	2
1.2 Corte de Tees.....	2
1.3 Corte de fairways y antegreens.....	2
1.4 Corte de rough.....	2
2.Topdressing.....	3
3.Fertilización.....	3
4. Control de malezas en el campo.....	4
5. Limpieza y mantenimiento.....	5
6. Reparaciones hidráulicas (riego).....	9
7. Monitoreo y registro del campo.....	10
7.1 Información meteorológica	10
7.2 Medición de humedad.....	11
8. Áreas adicionales.....	12
9. Checklist de compras semanales.....	13
10. Checklist actividades para la próxima semana.....	14



1. Corte de las áreas del campo de golf

1.1 Corte de Greens

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 20, 21, 22, 23 y 24 de julio
- ☐ Altura: 3.20 mm.

1.2 Corte de Tees

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 20, 21, 22 y 23 de julio
- ☐ Altura: 13 mm.

1.3 Corte de Fairways y antegreens

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 20, 21, 22, 23 y 24 de julio
- ☐ Altura: 13 mm.

1.4 Corte de roughs

Se realizó sin novedad.

- ☐ Fecha: 20, 21, 22 y 23 de julio
- ☐ Altura: 2 pulgadas.



2. Top dressing



Actividad: Top dressing en campo de práctica

Duración: 20 de julio

3. Fertilización



Actividad: Fertilización en greens

Duración: 21 y 22 de julio



Actividad: Fertilización con boleadora en fairways y roughs

Duración: 20 y 21 de julio



Actividad: Fertilización foliar en tees, fairways y roughs
Duración: 22, 23 y 24 de julio

4. Control de maleza en el campo



Actividad: Control maleza con mochila localizado
Duración: 20, 21, 22 y 23 de julio



Actividad: Control maleza con tractor (jacto)
Duración: 20 y 21 de julio



Actividad: Control malezas en loma de práctica
Duración: 20 de julio

5. Limpieza y mantenimiento campo de golf



Actividad: Grooming en greens
Duración: 20 de julio



Actividad: Nivelación de aspersores en antegreens
Duración: 20, 21, 22 y 23 de julio



Actividad: Aplicación de insecticida segunda vuelta
Duración: 20 de julio



Actividad: Sopladora alrededor de los greens
Duración: 20, 21, 22, 23 y 24 de julio



Actividad: Desmalezamiento en hoyos 1, 7, 8, 12 y 13
Duración: 20, 21, 22 y 23 de julio



Actividad: Mantenimiento en búnkers
Duración: 20, 21, 22, 23 y 24 de julio



Actividad: Corte con desbrozadora y flymo en talud de búnkers y orillos
Duración: 20, 21, 22 y 23 de julio




Actividad: Ampliación de tees (verticut) segunda vuelta
Duración: 21 de julio



Actividad: Colocación y demostración de tótems
Duración: 21 y 22 de julio



Actividad: Alineamiento de piedra chispa en salidas de carpath
Duración: 22 y 23 de julio




Actividad: Resiembra de vivero en campo de práctica
Duración: 22, 23 y 24 de julio



Actividad: Turbina en campo
Duración: 22 y 23 de julio



Actividad: Enrocado hoyo 6
Duración: 23 de julio

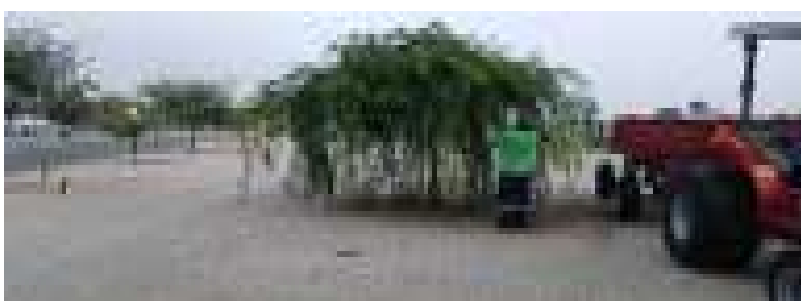

Actividad: Poda de árboles en campo
Duración: 24 de julio



Actividad: Topdressing sumidero hoyo 11

Duración: 24 de julio



Actividad: Mezcla de arena con biocompost para tapar divots

Duración: 24 de julio

6. Reparaciones hidráulicas (riego)



Actividad: Arreglo daño en válvula hoyo 14

Duración: 20 de julio



Actividad: Cable sulfatado en hoyo 10
Duración: 20 de julio



Actividad: Cambio de codificador en hoyo 10
Duración: 20 de julio



Actividad: Cambio de retenedor en hoyo 10
Duración: 20 de julio



Actividad: Arreglo daño en hoyo 14
Duración: 23 de julio




Actividad: Reposición de llave en hípica
Duración: 23 de julio

7. Monitoreo y registro del campo

Sin registro de lluvia



7.1 Medición de humedad

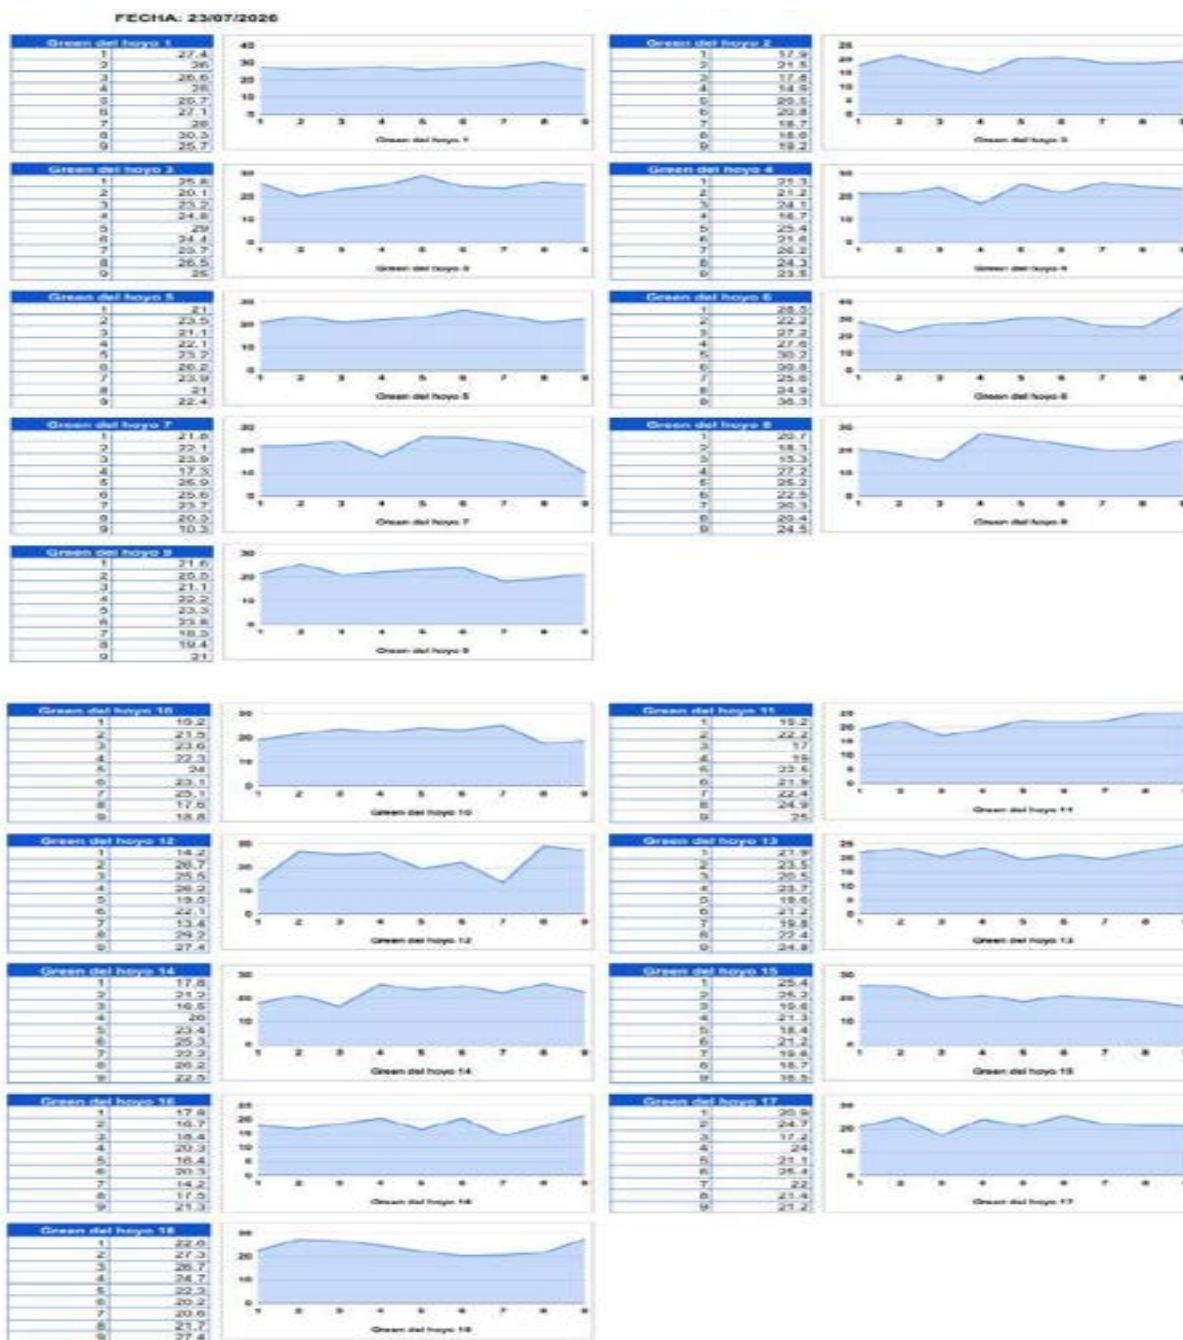



8. Áreas adicionales



Actividad: Mantenimiento en cancha de fútbol

Duración: 20 y 22 de julio



Actividad: Mantenimiento en casa club

Duración: 20, 21, 22 y 23 de julio



Actividad: Mantenimiento en garita principal

Duración: 20, 21, 22, 23 y 24 de julio



9. Checklist de compras semanales

Nº	DESCRIPCIÓN		P	EP	OK	OBSERVACIÓN
1	FUMIGADOR JACTO 600L	CAMPO DE GOLF	X			En espera de aprobación
2	ARENA PALENQUE 5 VIAJES	AIREACIÓN		X		En espera de despacho
3	AGROQUÍMICOS			X		En espera de despacho

Nº	DESCRIPCIÓN		P	EP	OK	OBSERVACIÓN
1	REPUESTO	GREENSMaster 3150		X		En espera de despacho
2	REPUESTO / TINES	PROCORE 648		X		En espera de despacho

10. Checklist actividades para la próxima semana

TRABAJO DE RUTINA, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CAMPO DE GOLF							
Cuarta semana de Julio	L	M	M	J	V	S	D
	27	28	29	30	31	1	2
GREENS:							
CORTE DE GREENS							
CEPILLO							
GROOMING							
VERTICUT							
AIREACION CON TINES SOLIDOS							
ARENAR GREENES ZONIFICADO							
PASAR MALLA							
RODILLO							



RECOGER SOBRANTE DE LA AIREACION								
ASEO								
FERTILIZACION FOLIAR								
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA								
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)								
CONTROL INTEGRADO DE HONGOS PREVENTIVO								
CAMBIO DE HOYOS								
TAMIZAR ARENA								
MEZCLAR ARENA CON FUNGICIDA EN POLVO								
VELOCIDAD 9.75								
MEDICION DE HUMEDAD								
RIEGO NOCTURNO								
ANTE GREENS:								
CORTE								
VERTICUT PARA AMPLIACION DE GREENS								
AIREACION CON TINES SOLIDOS								
PASAR MALLA								
ARENAR ANTEGREENES								
NIVELACION DE ASPERSORES								
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA								
RECOGER SOBRANTE DE LA AIREACION								
FERTILIZACION EDAFICA								
CONTROL MALEZA								
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)								
CONTROL DE HONGOS								



ARREGLO EN ZONAS ESCALPADAS SEGUNDA VUELTA							
RIEGO NOCTURNO							
TEES:							
CORTE							
VERTICUT							
RECOGER SOBRANTE DEL VERTICUT							
SIEMBRAS CON CHAMPAS ZONAS DONDE ESTABAN LAS MARCAS DE YARDAS							
REALIZAR MUESTRA DE JARDIN EN LOS TOTEMS							
AIREACION							
RECOGER NUCLEOS							
TURBINA							
FERTILIZACION							
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS							
CONTROL DE MALEZA							
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA							
RIEGO NOCTURNO							
FAIRWAYS:							
CORTE							
VERTICUT							
FERTILIZACION FOLIAR							
CONTROL DE MALEZA							
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)							
AIREACION ZONIFICADO							
PASAR MALLA PARA DESVANECER LOS NUCLEO DE LA AIREACION							
TURBINA							



RECOGER SOBRANTE DEL VERTICUT								
CONSTRUIR DRENAJE EN HOYO 15								
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA								
RIEGO NOCTURNO								
LAGUNAS								
BORDEO GUADAÑA Y MACHETE								
ENROCADO HOYO 6 Y 7								
APLICAR ACEITE QUEMADO EN HOYO 2, 5, 8, 12 Y 15								
BUNKERS:								
RASTRILLO/REMOVER ARENA								
REVISAR CAPAS DE ARENA								
CORTE TALUD BUNKERS Y DELINEAR BUNKERS								
ROUGHs:								
CORTE								
VERTICUT EN ZONAS DONDE SE AMPLIARAN LOS TEES								
FERTILIZACION								
TURBINA								
DESMALEZAR MANUAL								
AIREACION EN ZONA DONDE ESTA PERMEABLE								
RECOGER SOBRANTE DEL VERTICUT/ AIREACION								
CONTROL DE MALEZA								
PASAR MALLA PARA DESVANECER LOS NUCLEO DE LA AIREACION								
PASAR ROTOVITO EN TRAFICO DE CARRITOS DE GOLF								
TOP DRESSING SUMIDERO HOYO 1 Y 7								
DEFINIR ORILLOS DONDE HAY PIEDRA CHISPA EN EL CAMPO								



RESIEMBRA CON NUCLEOS DE LA AIREACION								
RIEGO NOCTURNO								
CAMPO DE PRACTICA								
CORTE								
CONTROL INTEGRADO DE MALEZAS								
AIREACION ZONIFICADA LINEA DE DIVOTS								
FERTILIZACIÓN EDAFICA								
FERTILIZACION POTTING Y CHIPPING GREEN								
TOPDRESSING GREENS / DRIVING DRENCH								
JARDINES CAMPO GOLF								
FERTILIZACION								
FUMIGACION 18H00 - 22H00								
CONTROL MALEZA								
CORREGIR DESNIVELES DEL SUELO CERCA DE LOS ARBOLES								
JARDINES GARITA PRINCIPAL								
FERTILIZACION								
CONTROL PLAGAS								
CONTROL MALEZA								
PODA DE ARBOLES								
APLICAR GLIFOSATO ORILLOS LAGO HOYO 2								
RIEGO CAMPO DE GOLF								
LIMPIEZA DE ASPERORES TAPADOS Y CODIFICACION								
CANCHA DE FUTBOL								
CORTE								
CONTROL MALEZA								



RIEGO							
TOPDRESSING							
FERTILIZACION FOLIAR							



CLUB DEPORTIVO BASICO GUAYAQUIL COUNTRY CLUB

MANTENIMIENTO CAMPO DE GOLF

REPORTE SEMANAL

Semana (lunes-viernes) Fecha: 27 al 31 de julio

Contenido

1. Corte de las áreas del campo de golf.....	2
1.1 Corte de Green.....	2
1.2 Corte de Tees.....	2
1.3 Corte de fairways y antegreens.....	2
1.4 Corte de rough.....	2
2.Topdressing.....	3
3.Fertilización.....	3
4.Control de malezas en el campo.....	4
5.Limpieza y mantenimiento.....	5
6.Reparaciones hidráulicas (riego).....	9
7.Monitoreo y registro del campo.....	10
7.1 Información meteorológica	10
7.2 Medición de humedad.....	11
8.Áreas adicionales.....	12
9.Checklist de compras semanales.....	13
10.Checklist actividades para la próxima semana.....	14



1. Corte de las áreas del campo de golf

1.1 Corte de Greens

Se realizó sin novedad.

- Fecha: 28, 29, 30 y 31 de julio
- Altura: 3.18 mm.

1.2 Corte de Tees

Se realizó sin novedad.

- Fecha: 27, 28, 29, 30 y 31 de julio
- Altura: 13 mm.

1.3 Corte de Fairways y antegreens

Se realizó sin novedad.

- Fecha: 27, 28, 29, 30 y 31 de julio
- Altura: 13 mm.

1.4 Corte de roughs

Se realizó sin novedad.

- Fecha: 27, 28, 29, 30 y 31 de julio
- Altura: 2 pulgadas.



2. Top dressing



Actividad: Topdressing en campo de práctica
Duración: 27 de julio



Actividad: Topdressing en zonas hundidas en campo
Duración: 31 de julio

3. Fertilización



Actividad: Fertilización en greens
Duración: 28 y 29 de julio



Actividad: Fertilización edáfica con voleadora manual en antegreens
Duración: 27 y 28 de julio




Actividad: Fertilización foliar en tees, fairways y roughs segunda vuelta
Duración: 27, 28 y 29 de julio



Actividad: Fertilización foliar en fairways y roughs zonas amarillas y escalpadas
Duración: 30 y 31 de julio



4. Control de maleza en el campo

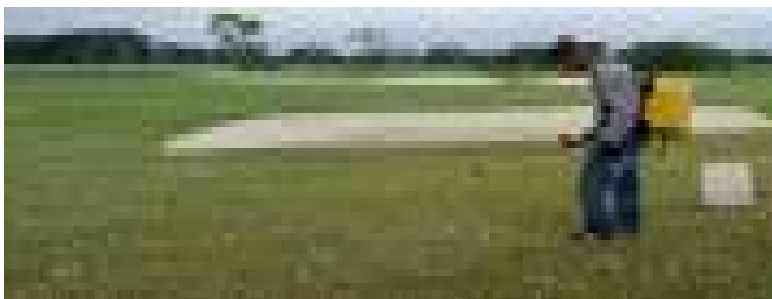

Actividad: Control maleza con mochila localizado en campo
Duración: 27, 28, 29, 30 y 31 de julio

5. Limpieza y mantenimiento campo de golf



Actividad: Grooming en greens
Duración: 27 de julio



Actividad: Limpieza de aspersores en loma de práctica
Duración: 27 de julio



Actividad: Bultos de maleza, trabajo realizado por caddies
Duración: 27 de julio



Actividad: Resiembra en green hoyo 6
Duración: 27 de julio



Actividad: Levantamiento de cajas eléctricas hoyo 6
Duración: 27 de julio



Actividad: Aplicación de yeso agrícola en greens
Duración: 27 y 28 de julio



Actividad: Aplicación de yeso agrícola en todo el campo
Duración: 27 y 28 de julio



Actividad: Sopladora alrededor de los greens
Duración: 27, 28, 29, 30 y 31 de julio



Actividad: Enrocado hoyo 6
Duración: 27, 28, 29 y 30 de julio



Actividad: Resiembra en marcas de yardaje anteriores
Duración: 27, 28 y 29 de julio




Actividad: Aplicación yeso agrícola en campo
Duración: 27, 28 y 29 de julio



Actividad: Mantenimiento en bunkers
Duración: 27, 28, 29, 30 y 31 de julio



Actividad: Desmalezamiento manual hoyo por hoyo
Duración: 27, 28, 29, 30 y 31 de julio

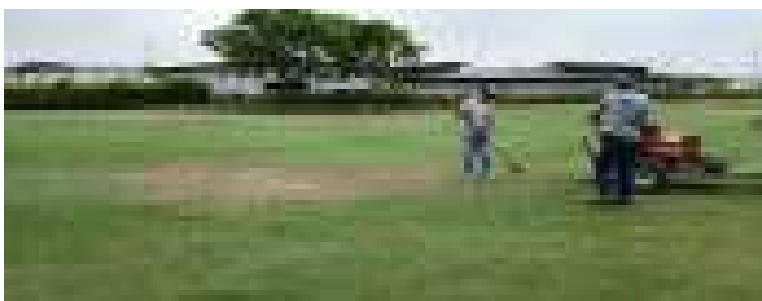

Actividad: Siembra en zonas escarpadas fairway hoyo 10
Duración: 28 de julio



Actividad: Siembra en zonas escalpadas tee hoyo 6
Duración: 29, 30 y 31 de julio



Actividad: Nivelación de adoquines para tránsito de maquinaria
Duración: 28 y 29 de julio



Actividad: Instalación de logo del club en los tótems
Duración: 28 y 29 de julio



Actividad: Turbina en campo
Duración: 29, 30 y 31 de julio



Actividad: Decoración de tótems
Duración: 30 y 31 de julio



Actividad: Limpieza borde de lagos y aplicación de herbicida
Duración: 30 de julio



Actividad: Alineamiento de piedra chispa en salidas de car path
Duración: 30 y 31 de julio



Actividad: Nivelación de aspersores en antegreens
Duración: 30 y 31 de julio



Actividad: Enrocado en hoyo 7
Duración: 30 y 31 de julio



Actividad: Instalación de tubería para dragado manual
Duración: 30 de julio



Actividad: Dragado manual en lago hoyo 8
Duración: 30 y 31 de julio



Actividad: Aseo de car path en todo el campo
Duración: 31 de julio



Actividad: Desbrozadora en filo de los lagos y car path
Duración: 30 y 31 de julio

6. Reparaciones hidráulicas (riego)



Actividad: Arreglo daño hidráulico rough hoyo 1
Duración: 27 de julio




Actividad: Arreglo en hípica
Duración: 31 de julio



7. Monitoreo y registro del campo

46 mm

7.1 Medición de humedad

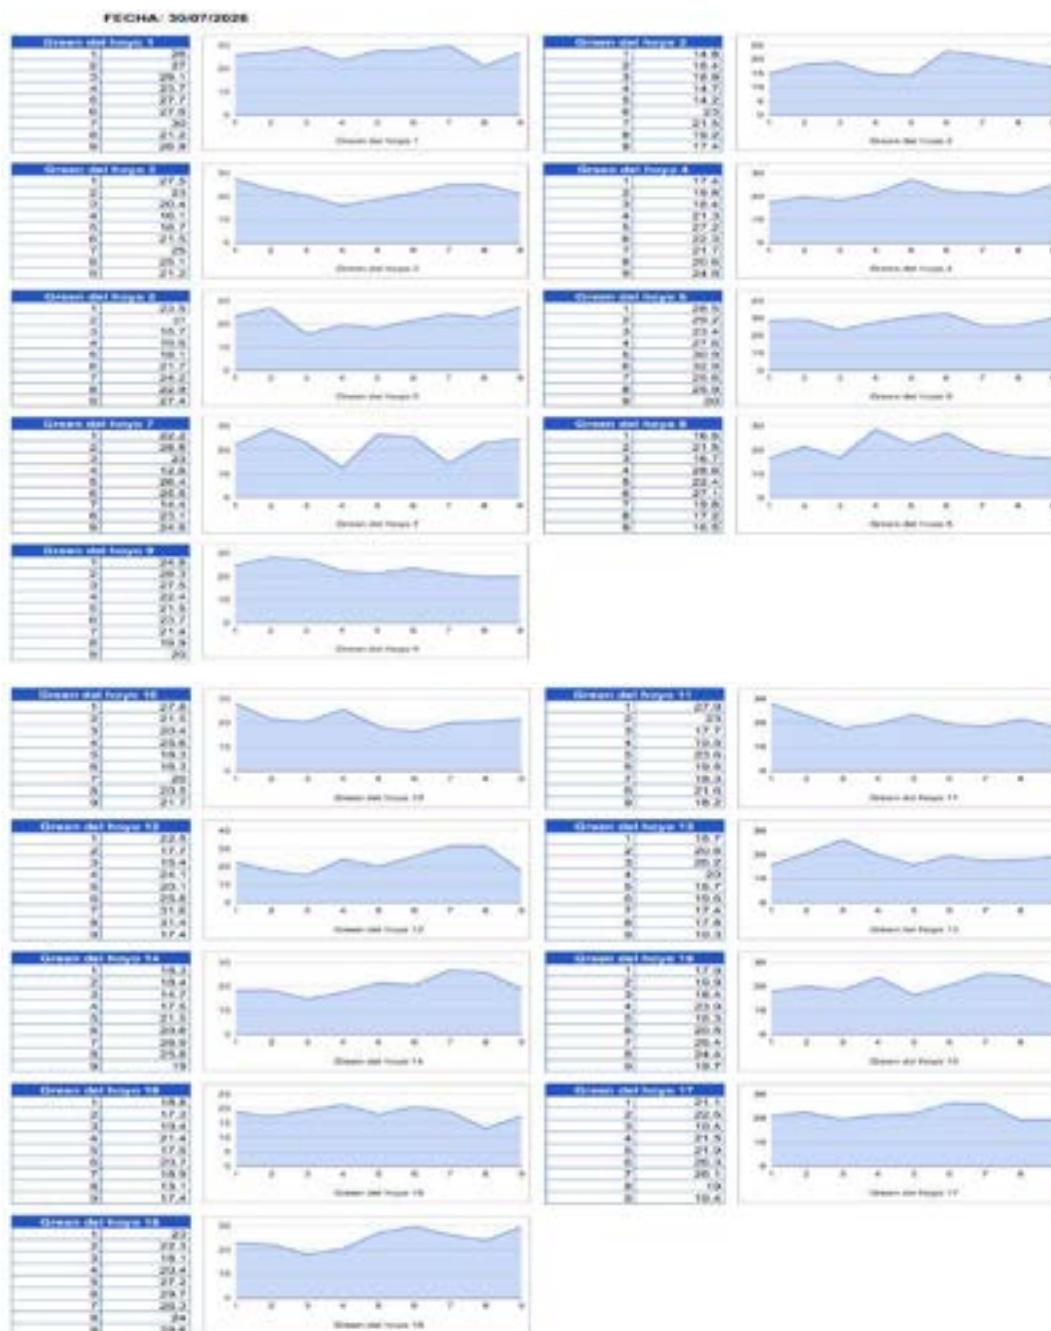



8. Áreas adicionales



Actividad: Mantenimiento en cancha de fútbol

Duración: 27, 30 y 31 de julio



Actividad: Mantenimiento en casa club

Duración: 27, 28, 29, 30 y 31 de julio



Actividad: Mantenimiento en garita principal

Duración: 27, 28, 29, 30 y 31 de julio



9. Checklist de compras semanales

Nº	DESCRIPCIÓN		P	EP	OK	OBSERVACIÓN
1	FUMIGADOR JACTO 600L	CAMPO DE GOLF	X			En espera de aprobación
3	AGROQUÍMICOS			X		En espera de despacho

Nº	DESCRIPCIÓN		P	EP	OK	OBSERVACIÓN
1	REPUESTO	GREENSMaster 3150		X		En espera de despacho
2	REPUESTOS	TRACTOR MF1650		X		En espera de despacho
3	REPUESTOS	TANQUE SPRAYING DEVICES INC	X			En espera de aprobación
4	REPUESTOS	DINGO TX525	X			En espera de aprobación

10. Checklist actividades para la próxima semana


TRABAJO DE RUTINA, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CAMPO DE GOLF							
Primera semana de Agosto	L	M	M	J	V	S	D
	3	4	5	6	7	8	9
GREENS:							
CORTE DE GREENS							
CEPILLO							
GROOMING							
VERTICUT							
AIREACION CON TINES SOLIDOS							
ARENAR GREENES							
PASAR MALLA							
RODILLO							



ASEO								
FERTILIZACION FOLIAR								
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA								
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)								
CONTROL INTEGRADO DE HONGOS PREVENTIVO								
CAMBIO DE HOYOS								
TAMIZAR ARENA								
MEZCLAR ARENA CON FUNGICIDA EN POLVO								
VELOCIDAD 9.75								
MEDICION DE HUMEDAD								
RIEGO NOCTURNO								
ANTE GREENS:								
CORTE								
VERTICUT PARA AMPLIACION DE GREENS								
GROOMING								
AIREACION CON TINES SOLIDOS								
PASAR MALLA								
ARENAR ANTEGREENES								
NIVELACION DE ASPERSORES								
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA								
RECOGER SOBRANTE DE LA AIREACION								
FERTILIZACION EDAFICA HOYO 7, 8, 13								
CONTROL MALEZA								
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)								
CONTROL DE HONGOS								



ARREGLO EN ZONAS ESCALPADAS PRIMERA VUELTA (HOYO 8)							
RIEGO NOCTURNO							
TEES:							
CORTE							
VERTICUT							
RECOGER SOBRANTE DEL VERTICUT							
REALIZAR MUESTRA DE JARDIN EN LOS TOTEMS							
AIREACION							
RECOGER NUCLEOS							
TURBINA							
FERTILIZACION							
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS							
CONTROL DE MALEZA							
APLICACIÓN DE YESO AGRICOLA							
RIEGO NOCTURNO							
FAIRWAYS:							
CORTE							
VERTICUT							
FERTILIZACION EDAFICA HOYO 13							
CONTROL DE MALEZA							
DESMALEZAR MANUAL							
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTICIDA)							
AIREACION ZONIFICADO							
PASAR MALLA PARA DESVANECER LOS NUCLEO DE LA AIREACION							
TURBINA							

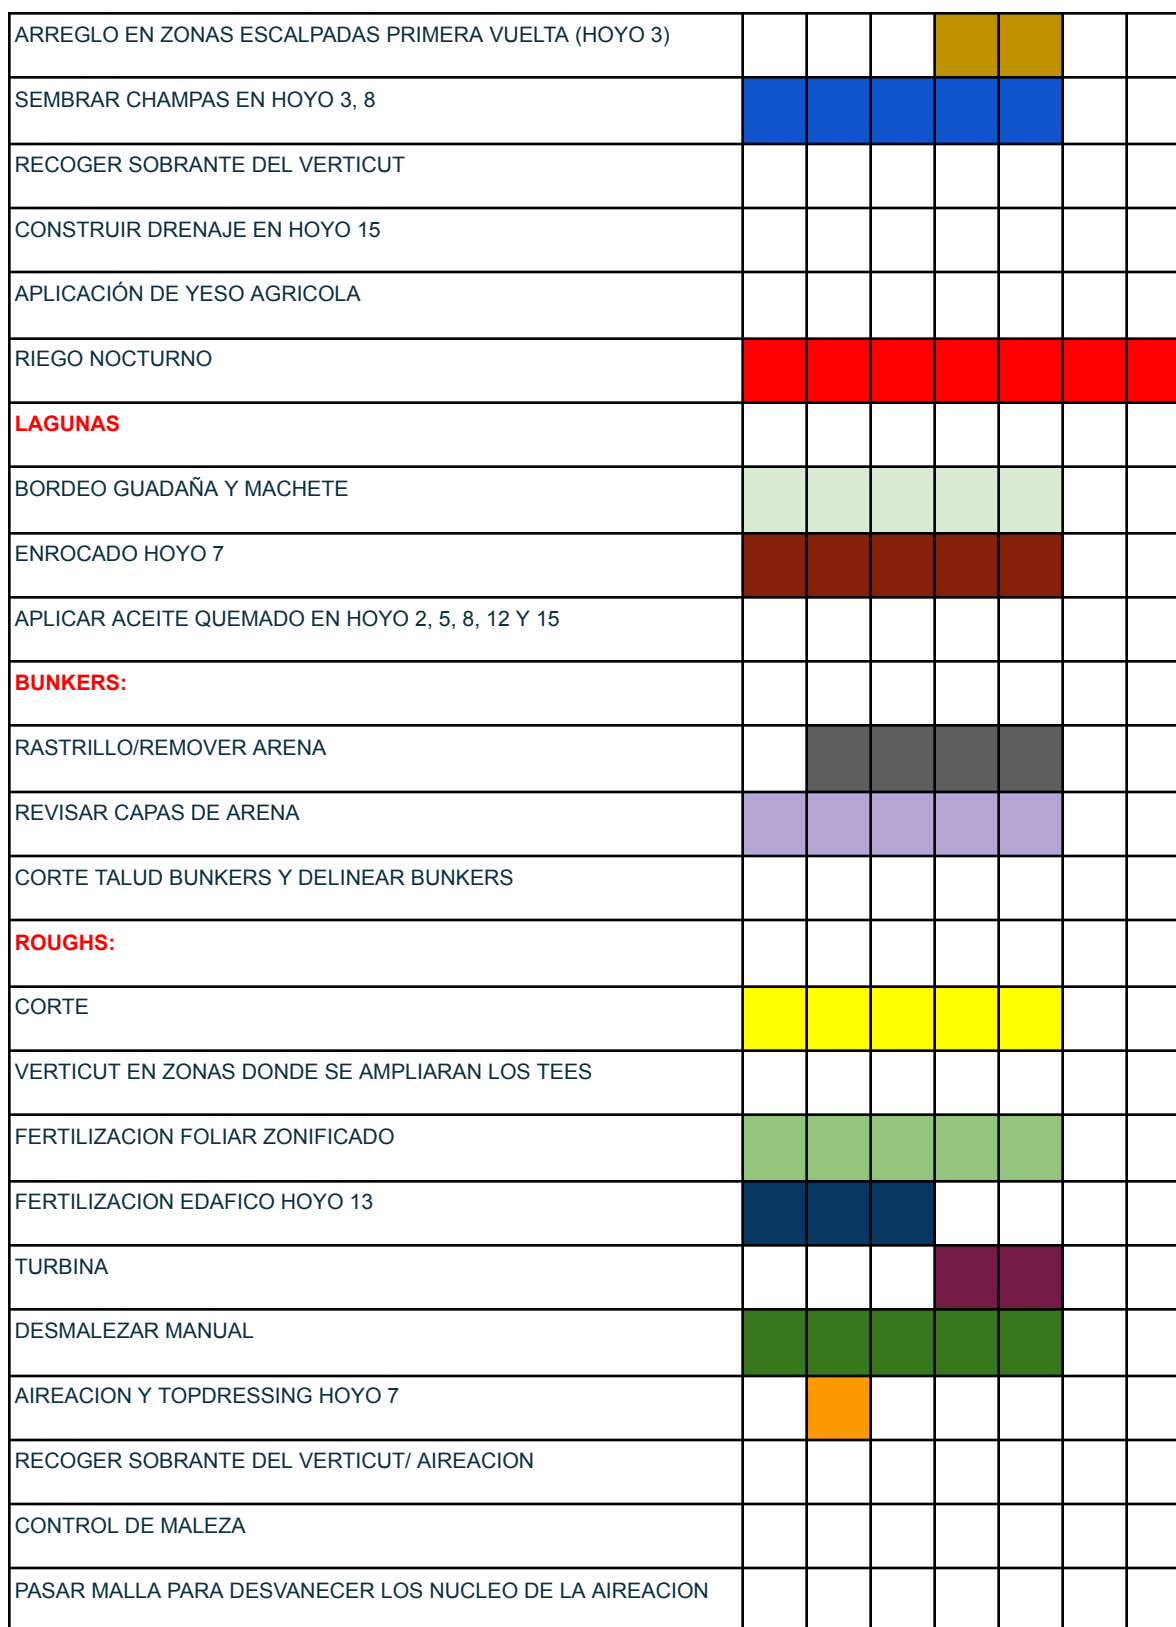



PASAR ROTOVITO EN TRAFICO DE CARRITOS DE GOLF								
RESIEMBRA CON NUCLEOS DE LA AIREACION								
RIEGO NOCTURNO								
CAMPO DE PRACTICA								
CORTE								
CONTROL INTEGRADO DE MALEZAS								
AIREACION ZONIFICADA LINEA DE DIVOTS								
FERTILIZACIÓN EDAFICA								
FERTILIZACION POTTING Y CHIPPING GREEN								
TOPDRESSING GREENS / DRIVING DRENCH								
JARDINES CAMPO GOLF								
FERTILIZACION								
FUMIGACION 18H00 - 22H00								
CONTROL MALEZA								
CORREGIR DESNIVELES DEL SUELO CERCA DE LOS ARBOLES								
JARDINES GARITA PRINCIPAL								
FERTILIZACION								
CONTROL PLAGAS								
CONTROL MALEZA								
PODA DE ARBOLES								
APLICAR GLIFOSATO ORILLOS LAGO HOYO 2								
RIEGO CAMPO DE GOLF								
LIMPIEZA DE ASPERSORES TAPADOS Y CODIFICACION								
CANCHA DE FUTBOL								
CORTE								



CONTROL MALEZA								
RIEGO								
TOPDRESSING								
FERTILIZACION FOLIAR								
